



Ansøgningsskema til etablering af gydebanke

Ansøgers oplysninger

Navn	Karup Å Sammenslutningen v. Ivan Andersen		
Adresse	Sugebækvej 2, 8653 Them		
Navn på evt. projektansvarlig	Ivan Andersen		
Telefon		E-mail	

Beskrivelse af projekt:

Formål	Karup Å Sammenslutningen vil gerne medvirke til at forbedre forholdene for flora og fauna i hele Karup Å-systemet herunder gyde forholdene for åens ørreder. Vi ønsker derfor at vedligeholde og supplere eksisterende gydebanker ved at udlægge grus på gydebankerne i Karup Å med det formål at vedligeholde og forbedre gyde- og opvækstområder for havørreder i vandløbet. Gydebanken nedstrøms Åvej i Karup By har været den mest producerende gydebanke i Karup Å systemet, men er anlagt med et tidligere krav om sejlrende i den ene side. Denne sejlrende er med tiden blevet skyllet dyb, således at strømmen næsten udelukkende løber her og gydegruset i venstre side (set nedstrøms) bliver tørlagt ved lave vandstande med den følge, at fiskenes æg dør. Kommunerne har nu opgivet kravet om sejlrender. Vi ønsker derfor at udbedre de tvivlsomme forhold ved at supplere gydebanken med udlægning af gydegrus og sten, så den fremstår i fuld bredde, som DTU Aqua anbefaler for at gydebanken bliver langtidsholdbar og funktionel. Vi ønsker derfor at opfylde sejlrenden med kartoffelsten og større sten samt ovenpå at supplere gydebanken med gydegrus af følgende blanding 75% valnøddesten (16-32mm) og 25% singles og håndsten (32-80mm) i en passende mængde, så gydebanken lever op til DTU's anbefalinger. Der søges desuden om tilladelse til at supplere gydebankerne med 10 % af grus mængden efter 2 år. Ved udlægningen anvendes "stokkemethoden" fra samme vejledning, således at vi kan etablere gydebanken med et fald på 2 promille. Vi forventer en maksimal opstuvning på 5 cm lige ved gydebankens start. Vi sikrer, igen ved aflæsning af stok med markering, at der 20 m opstrøms første gydebanke ikke kan registreres en ændring i vandstanden. Vi forventer en gennemsnitlig dybde over gydebanken på 0,35 m. Vi ønsker tillige at udlægge skjulesten i tilknytning til gydebanken lidt opstrøms for at lave turbulens og modvirke tilsanding og især nedstrøms til gavn for skjulesteder for ynglen. Vi vil tillige ansøge om tilladelse til at udplante vandplanter som vandranunkel og vandstjerne på og i forlængelse af gydebanken, som skjule for insekter og yngel. Vi ønsker forsøgsvis umiddelbart nedstrøms gydebanken midt i åen at udlægge stykker af træ rødder og fastgjorte grene dels for at skabe varierede strømforhold og som skjul for yngel men også for at skabe strømpres på sødgræsset i kanterne, så åen med tiden igen får en god bredde. Pælene til fastgørelse af grene og træ vil være synlige og række over vandoverfladen. Hvis de viser sig at give problemer, kan de let fjernes.		
Vandløbsnavn	Karup Å	Mængde af grus i m ³ (Bemærk: sammensætningen af gruset skal følge gældende vejledning fra DTU.)	Efter behov + store sten



Tekniske detaljer:

Antal gydebanker	1
Tykkelse af gruslag (cm)	40 - 100
Længde af gydebanker (m)	10 -15
Anlægges gydebanken i vandløbet fulde bredde?	Ja

Denne ansøgning skal vedlægges et kort med indtegnning af gydebankernes placering.

Berørte lodsejere:

Navn	Adresse	Matrikelnr. og ejerlav	Telefon nr.	E-mail:
[REDACTED]	[REDACTED]	2aa Kølvrå By, Karup	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	2e Karup By, Karup	[REDACTED]	[REDACTED]

Denne ansøgning skal vedlægges en underskrevet partserklæring fra hver berørt lodsejer.

Beskrivelse af adgangsvej og placering af evt. arbejdspladser:

Se bilag over tilkørselsvej.

Adgangsveje og evt. arbejdspladser til opmagasinering af grus kan med fordel indtegnes på det kort i vedlægges.

Beskrivelse af omfanget af maskinkørsel ved udlægning af gydebanke:

Gruset lægges ud direkte fra broen med lastbil med kran.

Økonomiske forhold:

Prisoverslag	Grus: 30000kr til grus og skjulesten 25000kr til udlægning
Afholdes af	Karup Å Sammenslutningen afholder udgifter til grus og sten . Vi ansøger Viborg Kommune om tilskud til udlægningen.



Forventet tidsplan:

Start: (måned / år)	August 2026
Slut: (måned / år)	15 oktober 2026

Øvrige bemærkninger til projekt, vandløb m.v.

--

Vedlagte bilag

Oversigtskort med indtegnning af gydebankens placering og evt. adgangsveje og arbejdspladser.	Sæt kryds: x
Antal vedlagte partserklæringer:	Antal: 2


Oversigtskort over placering af gydebanke i Karup Å ved Åvej:



Matrikelkort over området:



Satellitfoto over området:

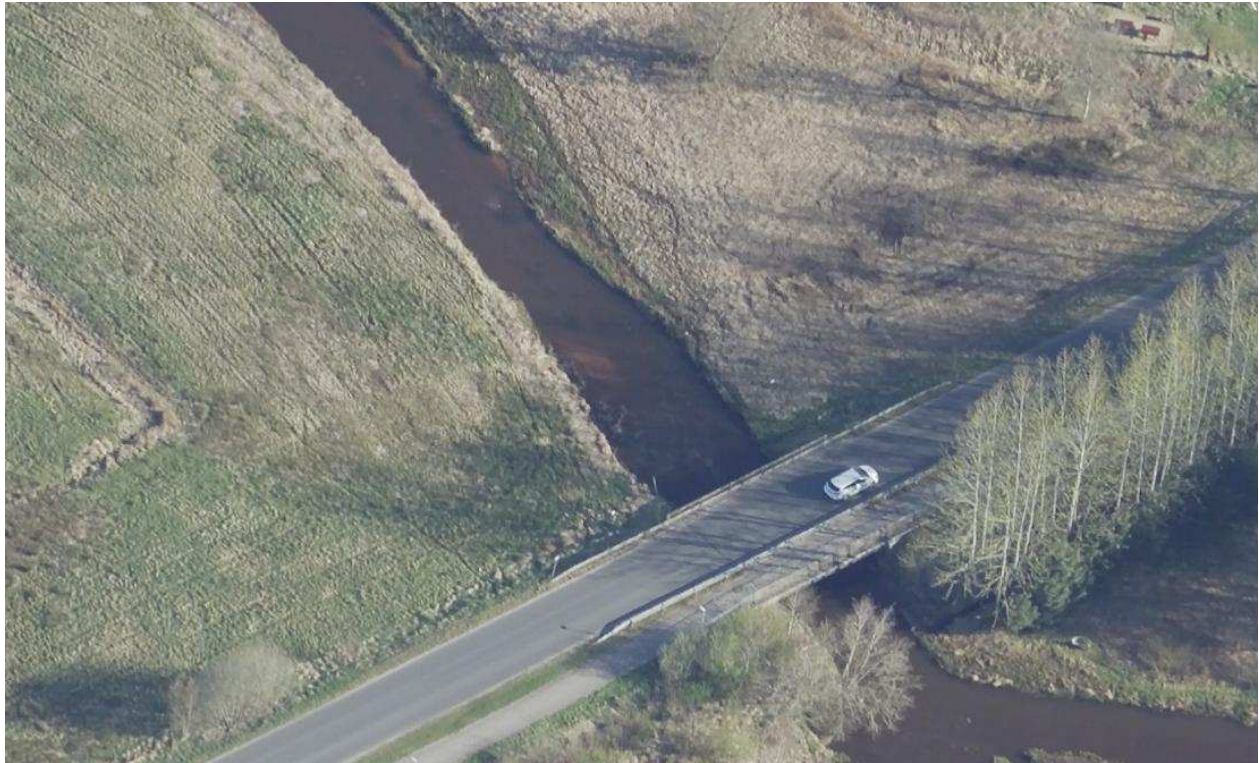

Placering af gydebanke og sejltrede:



Gruset udlægges direkte fra lastbil med kran.



Foto taget 24-1-2026.

Sejlrenden til højre fyldes op og der suppleres med gydegrus ovenpå og foran gydebanken til venstre.
